

**CLFC/2023/8 del 19 dicembre 2023**

**CONSIGLIO LOCALE di FORLI'-CESENA**

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Presa d'atto del consuntivo 2022 - Gestore Hera S.p.A.**

**IL COORDINATORE**

...Giuseppe Petetta.....

CLFC/2023/8

**CONSIGLIO LOCALE di FORLÌ'-CESENA**

L'anno 2023 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 11:00 si è riunito il Consiglio Locale di Forlì-Cesena convocato con lettera protocollo PG.AT/2023/0012767 del 13/12/2023, in seduta telematica. Assume la presidenza il Coordinatore Giuseppe Petetta. Risultano presenti all'appello per la votazione in oggetto:

<b>Comune</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presenti</b>	<b>Quote</b>
Provincia di Forlì Cesena			no	10
Bagno di Romagna	Enrico Spighi	Assessore, Delegato	Sì	1,5724
Bertinoro	Raffaele Trombini	Assessore, Delegato	Sì	2,5384
Borghi			no	0,8634
Castrocaro Terme Terra del Sole	Francesco Billi	Sindaco	Sì	1,6499
Cesena	Francesca Lucchi	Assessore, Delegato	Sì	20,1987
Cesenatico	Jacopo Agostini	Assessore, Delegato	Sì	5,5679
Civitella di Romagna			no	1,0861
Dovadola			no	0,6443
Forlì	Giuseppe Petetta	Assessore, Delegato	Sì	24,4368
Forlimpopoli	Gian Matteo Peperoni	Assessore, Delegato	Sì	2,9912
Galeata			no	0,8216
Gambettola			no	2,4223
Gatteo			no	2,147
Longiano			no	1,7173
Meldola	Filippo Santolini	Assessore, Delegato	Sì	2,373
Mercato Saraceno	Ignazio Palazzi	Assessore, Delegato	Sì	1,7505
Modigliana			no	1,2797
Montiano			no	0,6526
Portico San Benedetto			no	0,4594
Predappio	Roberto Canali	Sindaco	Sì	1,6514
Premilcuore			no	0,4665
Rocca San Casciano			no	0,7146
Roncofreddo			no	1,0038
San Mauro Pascoli			no	2,599
Santa Sofia			no	1,1692
Sarsina	Enrico Cangini	Sindaco	Sì	1,0467
Savignano sul Rubicone	Natascia Bertozzi	Assessore, Delegato	Sì	3,9321
Sogliano al Rubicone			no	0,9739
Tredozio			no	0,561
Verghereto			no	0,7092

Presenti n. 12 quote 69,5924

Assenti n. 19 quote 30,4076

Riconosciuta la validità della seduta, il Coordinatore Giuseppe Petetta invita a passare alla trattazione.

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Presa d'atto del consuntivo 2022 - Gestore Hera S.p.A.**

**Vista** la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

**accertato** che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1 gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

**considerato** che:

- con deliberazione 34/2019/R/IDR, l'Autorità di Regolazione nazionale ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) relativo alle annualità 2020-2023, poi approvato con deliberazione 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr;
- con deliberazione n.9 del 28 novembre 2019 il Consiglio locale di Forlì-Cesena ha approvato il programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2020-2023 del Gestore Hera Spa;
- con deliberazione n.10 del 27 luglio 2022 il Consiglio locale di Forlì-Cesena ha approvato la revisione del programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2022-2023 del Gestore Hera s.p.a.;

**considerato** altresì che:

- con deliberazione n. 84 del 12 settembre 2022 il Consiglio d'ambito ha approvato la revisione delle "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato" di cui alla CAMB n. 75/2017;
- tale deliberazione tra l'altro dispone che il Consiglio locale:
  - esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
  - individua gli interventi per i quali avviare eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti del Gestore da proporre al Consiglio d'ambito, in relazione a quanto previsto dalle Convenzioni di servizio vigenti;
  - ratifica la revisione puntuale del POI avvenuta con nulla osta della struttura tecnica di ATERSIR;

**dato atto** che il gestore HERA Spa ha completato la rendicontazione degli investimenti 2022 attraverso il software ARSI;

**dato atto** altresì che l'istruttoria condotta dalla struttura tecnica di ATERSIR in merito alla rendicontazione degli investimenti 2022 è sintetizzata nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

**rilevato** che:

- nell'annualità 2022 dalla struttura tecnica di ATERSIR non sono stati rilasciati nulla osta ai sensi della deliberazione CAMB n.84/2022 relativi ad interventi del bacino di Forlì-Cesena;
- dai dati presentati si evince che il Gestore ha rendicontato un ammontare complessivo di investimenti realizzati superiori di + 3.833.864,05 € rispetto a quanto previsto nell'annualità 2022 dal Programma degli interventi 2020-2023 approvato, valore corrispondente ad uno scostamento percentuale pari al +22%;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del Gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- tale verifica ha evidenziato che i ritardi suddetti sono stati adeguatamente motivati dal Gestore del servizio idrico integrato;

**ritenuto** pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022 come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**visto** lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**a voti** resi nelle forme di legge, con voti favorevoli unanimi;

## **DELIBERA**

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022 dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera Spa come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Forlì-Cesena n. 8 del 19 dicembre 2023

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Presa d'atto del consuntivo 2022 - Gestore Hera S.p.A.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente  
Area Servizio Idrico Integrato  
F.to Marialuisa Campani

Bologna, 19 dicembre 2023

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
CONSUNTIVO INVESTIMENTI  
ANNO 2022  
GESTORE: HERA S.P.A.  
BACINO PROVINCIALE DI: FORLÌ' CESENA**

## 1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2022

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l'annualità 2022, del Programma operativo degli interventi (POI) approvato con Delibera del Consiglio Locale di Forlì-Cesena n.9 del 28 novembre 2019, successivamente aggiornato con Delibera n.22 del 27 luglio 2022, che il gestore HERA ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO2022	CONSUNTIVO2022	DIFFERENZA	DIFF%
<b>GESTORE</b>	11.847.978,00€	15.358.028,58€	3.510.050,58€	30%
<b>SOCIETA' TERZE</b>	4.382.213,00€	4.201.523,26€	-180.689,74€	-4%
<b>FONDO PERDUTO</b>	1.460.000,00€	1.964.503,21€	504.503,21€	35%
<b>TOTALE</b>	<b>17.690.191,00€</b>	<b>21.524.055,05€</b>	<b>3.833.864,05€</b>	<b>22%</b>

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2022

Gli investimenti di struttura per l'anno 2022 non sono ancora stati rendicontati (max. 1.774.384,00 € euro). Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi ("POI") e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2022.

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2022 investimenti superiori rispetto al pianificato per circa il 22%.

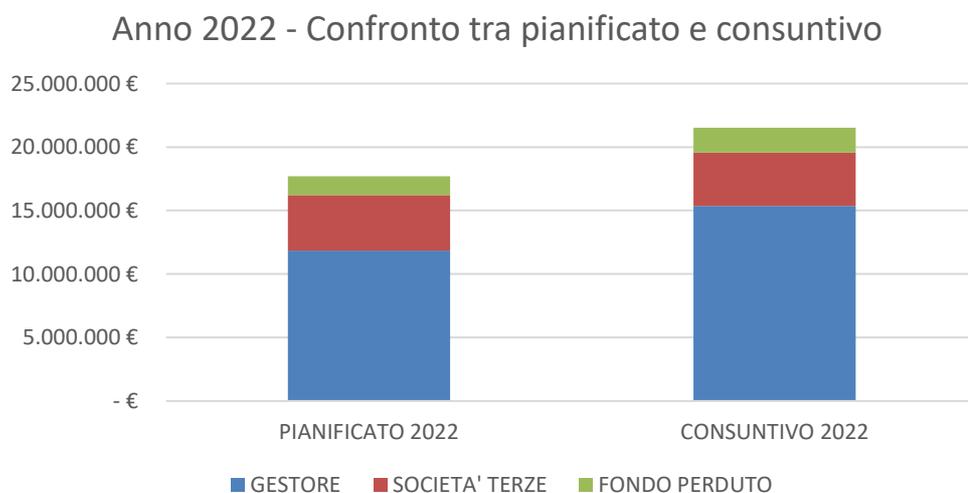


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2022

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si rimanda alle tabelle e i grafici successivi nonché all'Allegato 1 alla presente relazione.

## 2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio, nel quale si notano maggiori investimenti nei comparti acquedottistico e depurativo rispetto al pianificato, mentre per il comparto fognario presenta consuntivati sensibilmente inferiori ai programmati. Si registrano alcuni ritardi nelle fasi di progettazione e per ridefinizione di alcune priorità a fronte di nuove esigenze.

SERVIZIO	PIANIFICATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA	DIFF %
<b>ACQUEDOTTO</b>	8.541.306,00€	11.450.621,78€	2.909.315,78€	34%
<b>DEPURAZIONE</b>	3.300.000,00€	4.864.348,51€	1.564.348,51€	47%
<b>FOGNATURA</b>	5.848.885,00€	5.209.084,76€	-639.800,24€	-11%
<b>ACQUE BIANCHE</b>	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>17.690.191,00€</b>	<b>21.524.055,05€</b>	<b>3.833.864,05€</b>	<b>22%</b>

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2022 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:

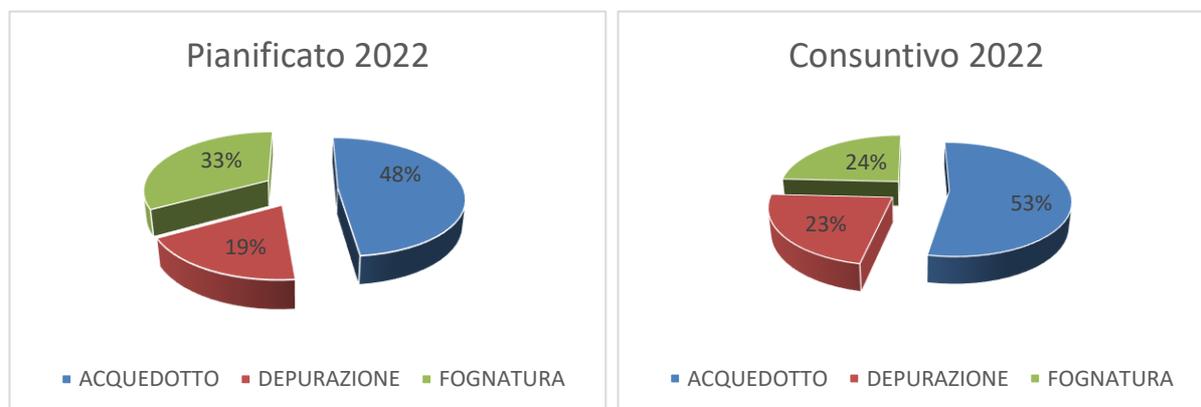


FIG.2 – Suddivisione investimenti 2022 per servizio

La tabella successiva da una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie, costituite da opere specifiche di manutenzione straordinaria individuate nel programma investimenti e dai titoli cumulativi di manutenzione straordinaria; per quest'ultimi è previsto un budget complessivo a cui il Gestore associa i microinterventi che si rendono necessari durante l'anno.

	<b>PIANIFICATO 2022</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>	<b>DIFFERENZA €</b>	<b>DIFF %</b>
<b>ACQUEDOTTO</b>	3.315.000,00 €	6.412.923,08 €	3.097.923,08 €	93,45%
<b>DEPURAZIONE</b>	1.010.000,00 €	2.487.434,45 €	1.477.434,45 €	146,28%
<b>FOGNATURA</b>	1.338.000,00 €	1.641.498,39 €	303.498,39 €	22,68%
<b>ACQUE BIANCHE</b>	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>5.663.000,00 €</b>	<b>10.541.855,92 €</b>	<b>4.878.855,92 €</b>	<b>86,15%</b>

TAB.3 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Di seguito si riportano gli importi pianificati e consuntivati classificati per fasce di importo progettuale degli interventi. Sono esclusi dal conteggio gli interventi tecnicamente conclusi in annualità precedenti senza importi pianificati né consuntivati nel 2022 (n.30), gli interventi annullati (n.7) e gli investimenti di struttura (n.2).

<b>CLASSI D'IMPORTO</b>	<b>NUM.</b>	<b>PIANIFICATO 2022</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>	<b>DIFFERENZA</b>	<b>DIFF. %</b>
<b>Fino a 500.000 €</b>	41	905.339,00 €	339.335,00 €	- 534.923,66 €	-59%
<b>500.000-1.000.000 €</b>	19	572.822,00 €	566.722,28 €	- 37.180,06 €	-7%
<b>1.000.000-2.000.000 €</b>	10	1.457.030,00 €	1.272.998,21 €	- 81.086,25 €	-5%
<b>2.000.000-5.000.000 €</b>	15	3.835.000,00 €	4.264.798,37 €	326.852,83 €	9%
<b>Oltre 5.000.000 €</b>	3	513.000,00 €	573.702,96 €	60.702,96 €	12%
<b>Titoli cumulativi</b>	28	10.407.000,00 €	14.506.498,23 €	4.099.498,23 €	39%
<b>TOTALE</b>	<b>116</b>	<b>17.690.191,00</b>	<b>21.524.055,05</b>	<b>3.833.864,05</b>	<b>22%</b>

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato, sono esclusi gli investimenti di struttura.

- Numero di interventi programmati nel 2022 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da zero): 51
- Numero di interventi rendicontati (con importo lordo maggiore di zero) nel 2022: 43.

	<b>NUMERO INTERVENTI</b>	<b>IMPORTO LORDO PIANIFICATO 2022</b>	<b>IMPORTO LORDO CONSUNTIVO 2022</b>
Interventi con un valore pianificato diverso da 0 e un valore consuntivato pari a 0 (-100%), cd "non avviati"	14	1.297.306,00€	-€
Interventi con un valore pianificato pari a 0 e un valore consuntivato diverso da 0 (+100%)	6	-€	733.994,56€
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore a + o - 20%	32	13.109.885,00€	17.216.437,95€
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore a + o - 20%	100	3.283.000,00€	3.573.622,54€

TAB.5 – Corrispondenza fra importi pianificati e consuntivati

Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti maggiori del +/- 20% sono

rinvenibili nell'Allegato 1 alla presente relazione.

**INTERVENTI NON AVVIATI**

	ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	IMPORTO PROGETTUALE	IMPORTO LORDO PIANIFICATO 2022
1	2014FCHA0012	POTEN.RETEACQSMARIANUOVA-LOTTO2	ACQUEDOTTO	Bertinoro	RomagnaAcque	750.265,00€	238.306,00€
2	2019FCHA0010	RAVAMPINGDIGESTORIDEPURATOREDICESENA	DEPURAZIONE	Cesena	UnicaReti	2.950.000,00€	18.000,00€
3	2019FCHA0015	RAVAMPINGDIGESTORIDELDEPURATOREDIFORLI'	DEPURAZIONE	Forlì	NONDEFINITO	2.000.000,00€	7.000,00€
4	2019FCHA0018	OTTIMIZZAZIONEDELSISTEMAFOGNARIODIGATTEOMARE	FOGNATURA	Gatteo	Gestore	100.000,00€	50.000,00€
5	2019FCHA0025	INTERFERENZESOTTOSERVIZIFOGNATURAACONRETEAUTOSTRADE-ATO8FC	FOGNATURA	OperePluricomunali	Gestore		10.000,00€
6	2022FCHA0001	RILIEVORETIFOGNARIE-ATO8	FOGNATURA	OperePluricomunali	Gestore		10.000,00€
7	2022FCHA0003	ADEGUAMENTISISMICIIMPIANTIERECUPEROAREESERBATOIENSILI-ATO8	ACQUEDOTTO	OperePluricomunali	Gestore		707.000,00€
8	2019FCHA0021	INTERCONNESSIONEACQUEDOTTISTICABAGNODIROMAGNA-TREDOZIO-VERGHERETO-CIVITELLA	ACQUEDOTTO	OperePluricomunali	RomagnaAcque	508.000,00€	22.000,00€
9	2022FCHA0004	ADEGUAMENTOATTRAVERSAMENTIFERROVIARI-ATO8	ACQUEDOTTO	OperePluricomunali	Gestore		10.000,00€
10	2019FCHA0020	INTERFERENZESOTTOSERVIZIACQUEDOTTOCONRETEAUTOSTRADE-ATO8FC	ACQUEDOTTO	OperePluricomunali	Gestore		10.000,00€
11	2019FCHA0028	POTENZIAMENTOIMPANTISTICOSERBATOIOSARSINA	ACQUEDOTTO	Sarsina	RomagnaAcque	571.000,00€	28.000,00€
12	2017FCHA0026	POTENZIAMENTODORSALESP138SARSINA/QUARTO	ACQUEDOTTO	Sarsina	Gestore	1.138.000,00€	55.000,00€
13	2019FCHA0035	SPOSTAMENTOIMPIANTODISOLLEVAMENTODELCANALECONSORZIALESITOINPROSSIMITÀDELL'INCROCIOVIAALBERAZZO-VIADELLALIBERTÀ	FOGNATURA	SavignanosulRubicone	Gestore	50.000,00€	50.000,00€
14	2019FCHA0033	REVAMPINGDIGESTORIDELDEPURATOREDISAVIGNANO	DEPURAZIONE	SavignanosulRubicone	NONDEFINITO	2.000.000,00€	82.000,00€

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Investimento di terzi pianificato 2022	Investimento gestore pianificato 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Investimento di terzi consuntivo 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Valore	%	Note giustificative
1	2015FCHA0005	RISAN. SC 5 - LOC.CA DI FOIETTA	F	Bagno di Romagna	Gestore	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023
2	2015FCHA0007	RISOLUZIONE INTERFERENZE CON SERVIZIO TECNICO DI BACINO	F	Bagno di Romagna	Gestore	850.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO
3	2014FCHA0006	RISAN. SC 17 AGGLOM.<200AE - V.CASELLINA	F	Bagno di Romagna	Gestore	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023
4	2015FCHA0002	RISAN. LOC. MARCONE	F	Bagno di Romagna	Gestore	225.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023
5	2014FCHA0007	RIS.SC.16 CASTELLO S.PIANA-II STRALCIO	F	Bagno di Romagna	Gestore	255.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023
6	2015FCHA0001	RISAN. SC.8 - LOC.PIAN DI GALLINA	F	Bagno di Romagna	Gestore	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023
7	2022FCHA0014	POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO ACQUEDOTTISTICO ACQUAPARTITA-CASENUOVE	A	Bagno di Romagna	Gestore	1.422.585,00 €	850.000,00 €	- €	- €	850.000,00 €	952.771,35 €	- €	- €	952.771,35 €	102.771,35 €	12	
8	2017FCHA0002	RISANAMENTO SC. 6-41 - LOC.ACQUAPARTITA	F	Bagno di Romagna	Unica Reti	2.941.000,00 €	710.000,00 €	- €	710.000,00 €	- €	1.187.516,16 €	- €	1.187.516,16 €	- €	477.516,16 €	67	LA POSA DELLE RETI, DELL'IMPIANTO E DEGLI ALLACCIAMENTI E COMPLETATA. I LAVORI RESTERANNO SOSPESI PER PRESCRIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, IN ATTESA DEL COMPLETAMENTO DELLE ASFALTATURE CHE, VEROSIMILMENTE, SARANNO ESEGUITE NEL PRIMO SEMESTRE 2024.
9	2015FCHA0003	RISAN. SC 4-7-9 LOC.VALGIANNA	F	Bagno di Romagna	Gestore	399.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023
10	2019FCHA0001	COSTRUZIONE NUOVO SOLLEVAMENTO VAL GIMIGLI	A	Bagno di Romagna	NON DEFINITO	251.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
11	2019FCHA0002	POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO ACQUEDOTTISTICO ACQUAPARTITA-CASENUOVE	A	Bagno di Romagna	Romagna Acque	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID ANNULLATO IN OCCASIONE DELL'AGGIORNAMENTO DI POI 2022-23 PER CAMBIO SOGGETTO FINANZIATORE DA RASDF A HERA. NUOVO ID 2022FCHA0014
12	2017FCHA0003	POTENZIAMENTO RETE IDRICA LOCALITA' LA FRATTA	A	Bertinoro	Unica Reti	693.802,00 €	- €	- €	- €	- €	58.102,41 €	- €	58.102,41 €	- €	58.102,41 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO ALLA CHIUSURA DEL FLUSSO DI FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' DEGLI ASSET
13	2014FCHA0017	RISANAMENTO SC1 S.PIETRO-SC3 S.ANDREA	F	Bertinoro	Romagna Acque	1.316.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO
14	2019FCHA0004	OTTIMIZZAZIONE DELLO SCOLMATORE "EX DEPURATORE BERTINORO"	F	Bertinoro	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID ANNULLATO IN OCCASIONE DELL'AGGIORNAMENTO DI POI 2022-23 IN QUANTO L' INTERVENTO NON RISULTA PIU' NECESSARIO. LO SCOLMATORE E' STATO TELECONTROLLATO ED E' STATO VERIFICATO CHE NON ESISTE LA CRITICITA' CHE NE AVEVA GENERATO L' INSERIMENTO A PIANO
15	2014FCHA0016	RISAN.SC 19-20 V.CERBIANO-BRACCIANO BERT	F	Bertinoro	Gestore	261.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023
16	2019FCHA0008	RISANAMENTO SCARICO 36 POLENTA BERTINORO	F	Bertinoro	NON DEFINITO	340.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023
17	2019FCHA0006	REALIZZAZIONE DEL SOLLEVAMENTO ROMPIRATTA SULLA PREMENTE "CAVALLI"	F	Bertinoro	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID ANNULLATO IN OCCASIONE DELL'AGGIORNAMENTO DI POI 2022-23 IN QUANTO L'OBIETTIVO DELL'INTERVENTO E' GIA' STATO RAGGIUNTO NELL' AMBITO DI UNA SERIE DI ATTIVITA' MANUTENTIVE E RENDICONTATO ALL' INTERNO DELL' ID 2014FCHA0094. L' IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CAVALLI E' STATO ADEGUATO E POTENZIATO E PERTANTO E' STATA RISOLTA LA PROBLEMATICA
18	2019FCHA0005	AUTOMAZIONE DELL'OPERA DI PRESA "CAPOCOLLE"	F	Bertinoro	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
19	2019FCHA0009	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA V. COLOMBARONE	F	Bertinoro	Unica Reti	868.000,00 €	55.000,00 €	- €	55.000,00 €	- €	16.350,37 €	- €	16.350,37 €	- €	38.649,63 €	-70	SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO AL PROLUNGARSI DELL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA VOLTA A DEFINIRE IL TRACCIATO DELLA TUBAZIONE DI FOGNATURA NERA A GRAVITA' TENENDO CONTO DEI VINCOLI PLANO-ALTIMETRICI(QUOTA DI SCORRIMENTO DEL PUNTO DI RECAPITO E ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE BEVANO)
20	2015FCHA0009	Risanamento SC.37-38 COLLINELLO	F	Bertinoro	Gestore	739.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023
21	2017FCHA0004	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA V.COLOMBARONE	F	Bertinoro	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA A ROMAGNA ACQUE SDF L'ID E' STATO ANNULLATO E SOSTITUITO DAL 2019FCHA0009
22	2014FCHA0013	POTENZIAMENTO RETE ACQ. SMARIA NUOVA LOTTO3	A	Bertinoro	Romagna Acque	747.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO
23	2019FCHA0003	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO "COLOMBARONE"	A	Bertinoro	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID ANNULLATO IN OCCASIONE DELL'AGGIORNAMENTO DI POI 2022-23 IN QUANTO AD OGGI, ANALIZZANDO LA SITUAZIONE DAL PUNTO DI VISTA TECNICO, NON SI RITIENE PIU' NECESSARIO PROCEDERE COL POTENZIAMENTO DEL SOLLEVAMENTO COLOMBARONE COME CONFERMATO ANCHE DA QUANTO RIVELATO DAL COMUNE
24	2014FCHA0015	POTENZIAMENTO RETE IDRICA VIA DISMANO	A	Bertinoro	Romagna Acque	87.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO
25	2019FCHA0007	OTTIMIZZAZIONE DELLO SCOLMATORE "COROMANO"	F	Bertinoro	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
26	2014FCHA0012	POTEN.RETEACQ S MARIANOVA-LOTTO2	A	Bertinoro	Romagna Acque	750.265,00 €	238.306,00 €	- €	238.306,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	238.306,00 €	-100	SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALLA DIFFICOLTA' DELL'IMPRESA NEL REPERIMENTO DEI MATERIALI E NELLA REALIZZAZIONE DI OPERE SPECIALISTICHE.
27	2017FCHA0005	POTENZIAMENTO RETE V. CORNACCHIARA	A	Borghi	Romagna Acque	602.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
28	2014FCHA0021	COLLETTAMENTO BORGHI-TRIBOLA A STRADONE	F	Borghi	Romagna Acque	1.141.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
29	2017FCHA0027	OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI CASTROCARO	F	Castrocaro Terra Sole	Gestore	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO
30	2014FCHA0029	ADEGUAMENTO DEP CESENA - SEDIM SECOND- 2 STRALCIO	D	Cesena	Gestore	1.662.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO
31	2014FCHA0038	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FOGN.CESUOLA-CESENA	F	Cesena	Gestore	6.008.000,00 €	513.000,00 €	- €	- €	513.000,00 €	573.702,96 €	- €	- €	573.702,96 €	60.702,96 €	11	
32	2015FCHA0011	RISANAMENTO SCARICHI 190-191-192-193 RIO EREMO	F	Cesena	Gestore	1.053.000,00 €	254.030,00 €	- €	- €	254.030,00 €	152.518,00 €	- €	- €	152.518,00 €	101.512,00 €	-39	INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA COERENTEMENTE ALLE TEMPSTICHE PREVISTE A POI. SCOSTAMENTO 2022 DI NATURA CONTABILE. DOVUTO AI RITARDI ACCUMULATI NELLE PASSATE ANNUALITA' E LEGATI ALLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA REGOLARIZZAZIONE DEGLI SCARICHI PRIVATI (INDIVIDUAZIONE POSIZIONE ALLACCI SINGOLI)
33	2014FCHA0031	RISANAMENTO LOCALITA' PIOPPA-CALABRINA	F	Cesena	Romagna Acque	2.181.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Investimento di terzi pianificato 2022	Investimento gestore pianificato 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Investimento di terzi consuntivo 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Valore	%	Note giustificative
34	2022FCHA0018	INSTALLAZIONE CENTRIFUGHE E SILOS FANGHI DEPURATORE DI CESENA	D	Cesena	Gestore	2.813.000,00 €	64.000,00 €	- €	- €	64.000,00 €	156.697,47 €	- €	- €	156.697,47 €	92.697,47 €	144	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA COME DA PIANIFICAZIONE PREVISTA A POI. NON SI EVIDENZIANO CRITICITA' ; SCOSTAMENTO LEGATO AL FLUSSO CONTABILE
35	2017FCHA0025	CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SOLLEVAMENTO GALLO	F	Cesena	Gestore	300.000,00 €	69.948,00 €	- €	- €	69.948,00 €	12.984,98 €	- €	- €	12.984,98 €	56.963,02 €	-81	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO AL FATTO CHE GLI IMPORTI IPOTIZZATI PER COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI SONO STATI INFERIORI. L'IMPORTO DELL'OPERA E' STATO COMPLESSIVAMENTE INFERIORE A QUANTO IPOTIZZATO A POI PER EFFETTO DEL RIBASSO D'ASTA
36	2022FCHA0007	RADDOPPIO VASCA OSSIDAZIONE DEPURATORE CESENA	D	Cesena	NON DEFINITO	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
37	2015FCHA0010	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO DISTRETTO CESENA	F	Cesena	Gestore	240.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO
38	2019FCHA0010	RAVAMPING DIGESTORI DEPURATORE DI CESENA	D	Cesena	Unica Reti	2.950.000,00 €	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	18.000,00 €	-100	INTERVENTO ANCORA DA PROGETTARE. RIPIANIFICATO IN RELAZIONE AD ATTENUAZIONE DELLE CRITICITA' AD ESSO COLLEGATE.
39	2014FCHA0028	LC.PIEVESISTINA-POTEN.RETE ACQUA CIVILE	A	Cesena	Romagna Acque	680.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
40	2014FCHA0103	ADEG. SERBATOIO MONTE DELLE VACCHE	A	Cesena	Gestore	730.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
41	2014FCHA0026	POT RETE V.CERVESE LOC.PIOPPA CALABRINA	A	Cesena	Gestore	296.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO
42	2019FCHA0011	INSTALLAZIONE CENTRIFUGHE E SILOS FANGHI DEPURATORE DI CESENA	D	Cesena	Romagna Acque	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID ANNULLATO IN OCCASIONE DELL'AGGIORNAMENTO DI POI 2022-23 PER CAMBIO SOGGETTO FINANZIATORE DA RASDF A HERA. NUOVO ID 2022FCHA0018
43	2014FCHA0039	NUOVA FOGNA NERA E SOLL.LOC.PIEVESISTINA	F	Cesena	Romagna Acque	3.633.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
44	2022FCHA0016	COLLETTAMENTO VIA DISMANO E VIA LERICI	F	Cesena	Gestore	443.996,00 €	- €	- €	- €	- €	7.159,68 €	- €	- €	7.159,68 €	7.159,68 €	100	SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO ALL' ANTICIPAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE
45	2014FCHA0033	RISANAMENTO SC 33 S.CRISTOFORO - CASE SCUOLE	F	Cesena	Gestore	290.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023
46	2014FCHA0025	POTENZIAMENTO RETE LOC.PIEVESISTINA	A	Cesena	Gestore	271.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO
47	2019FCHA0012	ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO IN V. TORRI - V. CASSINO NERI	F	Cesenatico	Gestore	345.000,00 €	249.000,00 €	- €	- €	249.000,00 €	116.359,40 €	- €	- €	116.359,40 €	132.640,60 €	-53	INTERVENTO IN FASE ESECUTIVA COME DA PIANIFICAZIONE PREVISTA A POI. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALL'AVVIO DEL CANTIERE NEL SECONDO SEMESTRE, CONSEGUENTE AL RITARDO ACCUMULATO GIA' NEL 2020/21 PER IL PROLUNGAMENTO DELLE ATTIVITA' AUTORIZZATIVE SIA CON CONSORZIO DI BONIFICA CHE PER OTTENIMENTO TITOLO ABILITATIVO
48	2017FCHA0028	Estensione acquedotto località Zotto a Civitella	A	Civitella di Romagna	Gestore	26.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
49	2014FCHA0047	RISANAMENTO SCARICHI 10-11-15 LOC. CASONE DOVADOLA	F	Dovadola	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023
50	2017FCHA0007	RISANAMENTO SCARICHI 1-4-5-7-12, DOVADOLA ,2°ST	F	Dovadola	Unica Reti	447.461,00 €	240.000,00 €	- €	240.000,00 €	- €	21.781,32 €	- €	21.781,32 €	- €	218.218,68 €	-90	SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALLA NECESSITA' DI COMPLETARE L' ATTIVITA' DI RILIEVO DEGLI ALLACCI (PREVISTA CONCLUSIONE PER I TRIM 2023). SOLO A SEGUITO DEL COMPLETAMENTO DELLA SEPARAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI DI VIA DEL CANALE SI POTRA' POI TERMINARE L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PROSEGUIRE CON GLI ALTRI STRALCI DI CANTIERE
51	2014FCHA0066	REALIZZ.FOGNA NERA VSAVIO - FORLIMPOPOLI	F	Forlimpopoli	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
52	2022FCHA0017	INSTALLAZIONE CENTRIFUGA E SILOS FANGHI DEPURATORE DI FORLÌ - II STRALCIO	D	Forlì	Gestore	1.050.000,00 €	64.000,00 €	- €	- €	64.000,00 €	122.922,50 €	- €	- €	122.922,50 €	58.922,50 €	92	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA COME DA PIANIFICAZIONE PREVISTA A POI. NON SI EVIDENZIANO CRITICITA' ; SCOSTAMENTO LEGATO AL FLUSSO CONTABILE
53	2014FCHA0054	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO FOGNARIO CARPENIA-VIA REDEFOSSI 6A	F	Forlì	Gestore	498.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023
54	2017FCHA0009	INSTALLAZIONE CENTRIFUGA E SILOS FANGHI DEPURATORE DI FORLÌ - I° STRALCIO	D	Forlì	Unica Reti	861.239,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO
55	2014FCHA0065	RISANAMENTO SCARICHI 213,214 LOCALITA BORGO SISA	F	Forlì	Romagna Acque	747.000,00 €	57.516,00 €	- €	57.516,00 €	- €	29.200,00 €	- €	29.200,00 €	- €	28.316,00 €	-49	INTERVENTO TECNICAMENTE TERMINATO. SCOSTAMENTO 2022 DI NATURA CONTABILE LEGATO ALLA TEMPISTICHE DI FATTURAZIONE
56	2014FCHA0058	RISANAMENTO SCARICO 222 CARPINELLO - VIA B. DA DURAZZO	F	Forlì	Gestore	453.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023
57	2022FCHA0008	REALIZZAZIONE SISTEMA DI FILTRAZIONE DEPURATORE FORLÌ	D	Forlì	Gestore	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
58	2022FCHA0013	COPERTURA SEDIMENTATORI PRIMARI DEPURATORE FORLÌ	D	Forlì	Gestore	3.207.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
59	2019FCHA0016	INSTALLAZIONE CENTRIFUGA E SILOS FANGHI DEPURATORE DI FORLÌ - II STRALCIO	D	Forlì	NON DEFINITO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID ANNULLATO IN OCCASIONE DELL'AGGIORNAMENTO DI POI 2022-23 PER CAMBIO SOGGETTO FINANZIATORE DA RASDF A HERA. NUOVO ID 2022FCHA0017
60	2022FCHA0011	ADEGUAMENTO SISTEMA TRATTAMENTO FANGHI DEPURATORE FORLÌ	D	Forlì	Gestore	6.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
61	2019FCHA0013	REALIZZAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO FANGHI CON ULTRASUONI	D	Forlì	Gestore	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO
62	2019FCHA0014	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO RONCO LIDO	D	Forlì	NON DEFINITO	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
63	2014FCHA0061	RISAN. SCARICHI N.215-216-217 LA ROTTA	F	Forlì	Gestore	1.021.000,00 €	234.000,00 €	- €	- €	234.000,00 €	13.918,94 €	- €	- €	13.918,94 €	220.081,06 €	-94	SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO ALLA VARIANTE NECESSARIA PER L'ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADALE DA EFFETTUARE TRAMITE TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (RIF. NIF-03-IN-02-A14-000058). NECESSARIA ANCHE LA RIPROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO A SEGUITO DELLA SCADENZA DELL'ACCORDO PRELIMINARE CON LA USL ROMAGNA.
64	2017FCHA0012	RISANAMENTO POGGIO-BARISANO-DURAZZANINO-2°STR	F	Forlì	Gestore	2.529.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023
65	2017FCHA0008	ADEGUAMENTO SISTEMA DI TRATTAMENTO CADITOIE DEPURATORE DI FORLÌ	D	Forlì	Gestore	2.400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
66	2019FCHA0015	RAVAMPING DIGESTORI DEL DEPURATORE DI FORLÌ	D	Forlì	NON DEFINITO	2.000.000,00 €	7.000,00 €	- €	- €	7.000,00 €	- €	- €	- €	- €	7.000,00 €	-100	INTERVENTO ANCORA DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. RIPIANIFICATO IN RELAZIONE AD ATTENUAZIONE DELLE CRITICITA' AD ESSO COLLEGATE.
67	2014FCHA0060	RISANAMENTO SCARICHI 211-212 LOC. MARATELLO -VIA MONDO	F	Forlì	Gestore	337.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023
68	2014FCHA0070	SCARICO 12 VIA VERDI GAMBETTOLA	F	Gambettola	Gestore	739.000,00 €	164.000,00 €	- €	- €	164.000,00 €	87,59 €	- €	- €	87,59 €	163.912,41 €	-99	INTERVENTO SUDDIVISO IN DUE STRALCI. IL PRIMO, SC.12 V.VERDI STR.1 V.LE CARDUCCI, E' COMPLETATO NEL 2019. IL SECONDO, SC.12 V.VERDI STR.2 V.LE VENETO, E' A SUA VOLTA SUDDIVISO IN DUE LOTTI, IL PRIMO DEI QUALI, RELATIVO A VIALE CARDUCCI, E' COMPLETATO. IL SECONDO LOTTO, COME GIA' EVIDENZIATO NELLE NOTE DI SCOSTAMENTO 2021, EVIDENZIA PROBLEMATICHE LEGATE ALLE ATTIVITA' PROGETTUALI NECESSARIE ALLE VERIFICHE SULLA RETE ESISTENTE.
69	2014FCHA0069	SCARICO 3 VIA DELLA VIOLE	F	Gambettola	Gestore	290.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO
70	2019FCHA0017	ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO GAMBETTOLA	F	Gambettola	NON DEFINITO	1.128.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Investimento di terzi pianificato 2022	Investimento gestore pianificato 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Investimento di terzi consuntivo 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Valore	%	Note giustificative	
71	2019FCHA0018	OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI GATTEO MARE	F	Gatteo	Gestore	100.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	-100	L'INTERVENTO PREVEDE PICCOLI COMPLETAMENTI SULLE SEPARAZIONI DELLE RETI GIÀ REALIZZATE E CHE SONO IN ATTESA DI ORDINANZA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE. LA PROGETTAZIONE DI QUESTI PICCOLI INTERVENTI È STATA AVVIATA A FINE DEL 2022 PERTANTO LO SCOSTAMENTO È LEGATO ALLE TEMPISTICHE DI CONTABILIZZAZIONE. I LAVORI SONO PREVISTI NEL 2023 CON COMPLETAMENTO NELLE TEMPISTICHE PREVISTE A POI.	
72	2022FCHA0015	SEPARAZIONE RETE FOGNARIA AGGLOMERATO GATTEO MARE	F	Gatteo	Unica Reti	6.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
73	2014FCHA0076	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMHOFF TEODORANO-SC6-200AE	F	Meldola	Gestore	291.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023	
74	2014FCHA0079	DISMISSIONE DEPURATORE BORGO STECCHI	D	Mercato Saraceno	Gestore	165.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO	
75	2015FCHA0015	RISANAMENTO SCARICO LOC. CIOLA (<200 A.E.)	F	Mercato Saraceno	Gestore	382.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023	
76	2022FCHA0006	REALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO E CONDOTTA MODIGLIANA	F	Modigliana	NON DEFINITO	719.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
77	2017FCHA0014	NUOVO SERBATOIO E SOLLEV. FRATI 2	A	Modigliana	Gestore	320.000,00 €	31.000,00 €	- €	- €	31.000,00 €	54.493,13 €	- €	- €	54.493,13 €	23.493,13 €	75	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE PRELIMINARE COME DA PIANIFICAZIONE PREVISTA A POI. NON SI EVIDENZIANO CRITICITÀ; SCOSTAMENTO LEGATO AL FLUSSO CONTABILE	
78	2014FCHA0096	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO CESOLINO - II STRALCIO	F	Opere Pluricomunali	Romagna Acque	551.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO	
79	2015FCHA0017	RECUPERO AREE SERBATORI PENSILI DISMESSI FC-ATO8	A	Opere Pluricomunali	Gestore	2.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	191.945,54 €	- €	- €	191.945,54 €	191.945,54 €	100	ID SPECIFICO SOSTITUITO DA ID CUMULATIVO 2022FCHA0003. SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID NON HA IMPORTI PIANIFICATI; I CONSUTIVI SONO RIFERITI AL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RECUPERO IN CORSO (PENSILE DI CASE MURATE, RONCADELLO E TORRE VECCHIA) E NON TRASFERITI SUL NUOVO ID CUMULATIVO (IN QUANTO AVVIATI ANTE CREAZIONE DEL NUOVO ID CUMULATIVO).	
80	2018FCHA0005	Investimenti di struttura	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.774.384,00 €	- €	- €	1.774.384,00 €	- €	- €	- €	- €	- 1.774.384,00 €	-100	INVESTIMENTI DI STRUTTURA RENDICONTATI SEPARATEMENTE	
81	2014FCHA0097	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO CESOLINO - I STRALCIO	F	Opere Pluricomunali	Romagna Acque	600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO	
82	2014FCHA0083	RINN. RETI/ALL. ACQUA DA PI - FC-ATO 8	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.300.000,00 €	- €	- €	1.300.000,00 €	2.626.004,39 €	- €	- €	2.626.004,39 €	1.326.004,39 €	102	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU RETI E ALLACCI ACQUEDOTTO CONSEGUENTI A SEGNALAZIONI DI PRONTO INTERVENTO	
83	2015FCHA0019	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE -FC-ATO8	D	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	16.986,11 €	- €	- €	16.986,11 €	1.986,11 €	13		
84	2014FCHA0090	ADEG. SICUREZZA IMP. DEP. - FC - ATO 8	D	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €	67.630,85 €	- €	- €	67.630,85 €	- 82.369,15 €	-54	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
85	2014FCHA0126	VERIF.E ADEG.SISMICI IMP.ACQ FC-ATO 8	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.644.137,00 €	- €	- €	- €	- €	30.867,42 €	- €	- €	30.867,42 €	30.867,42 €	100	ID SPECIFICO SOSTITUITO DA ID CUMULATIVO 2022FCHA0003. SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID NON HA IMPORTI PIANIFICATI; I CONSUTIVI SONO RIFERITI AL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SIMICO PENSILE (PENSILE VILLA SELVA) E NON TRASFERITI SUL NUOVO ID CUMULATIVO (IN QUANTO AVVIATI ANTE CREAZIONE DEL NUOVO ID CUMULATIVO).	
86	2014FCHA0132	RINN. RETI/ALL.FOG. DA PI -FC-ATO 8	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	500.000,00 €	- €	- €	500.000,00 €	374.115,63 €	- €	- €	374.115,63 €	- 125.884,37 €	-25	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO IN AMBITO FOGNARIO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
87	2015FCHA0020	TELECONTROLLO E AUTOM.IMP.FOGNA-FC-ATO8	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	17.484,99 €	- €	- €	17.484,99 €	2.484,99 €	16		
88	2022FCHA0020	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - FC-ATO8 - UNICA RETI	A	Opere Pluricomunali	Unica Reti	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
89	2014FCHA0098	COLLETTAMENTO REFLUI AL DEP. DI BACCIO-RANCHIO BORELLO	F	Opere Pluricomunali	Romagna Acque	4.010.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
90	2014FCHA0131	TELECONTROLLO E AUTOMAZ.IMP.ACQ.-FC-ATO8	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	87.606,99 €	- €	- €	87.606,99 €	47.606,99 €	119	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
91	2018FCHA0006	Investimenti di struttura (TICSI e TIBSI)	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	249.612,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
92	2022FCHA0002	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - ATO 8	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €	209.361,50 €	- €	- €	209.361,50 €	59.361,50 €	39	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI LEGATE ALLA DISTRETTUALIZZAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
93	2014FCHA0093	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - FC-ATO 8	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €	82.828,14 €	- €	- €	82.828,14 €	- 67.171,86 €	-44	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE IN AMBITO FOGNARIO	
94	2019FCHA0025	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 8 FC	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 10.000,00 €	-100	CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE NEL 2022 ESIGENZE DI INTERVENTI SULLA CONDOTTE PER PROBLEMATICHE DI INTERFERENZE CON LA RETE AUTOSTRADALE	
95	2014FCHA0084	RINNOVO RETI PROGRAMMATO - FC-ATO 8	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.680.000,00 €	- €	- €	1.680.000,00 €	2.766.650,96 €	- €	- €	2.766.650,96 €	1.086.650,96 €	64	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTISTICHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
96	2019FCHA0019	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIANTI DI UTENZA C/TO CLIENTE ACQUEDOTTO - ATO 8 FC	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.060.000,00 €	1.060.000,00 €	- €	- €	1.454.950,20 €	1.307.715,50 €	- €	- €	147.234,70 €	394.950,20 €	37	CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE ESTENSIONI RETI SONO DETERMINE DALLA RICHIESTE DEI CLIENTI.
97	2022FCHA0021	RINN. RETI FOG. PROGRAMMATO-FC-ATO - UNICA RETI	F	Opere Pluricomunali	Unica Reti	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
98	2014FCHA0087	ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-FC-ATO8	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	121.469,14 €	- €	- €	121.469,14 €	21.469,14 €	21	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
99	2019FCHA0022	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - FC ATO 8	A	Opere Pluricomunali	Gestore	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO	
100	2019FCHA0024	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO CLIENTE FOGNATURA - ATO 8 FC	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	400.000,00 €	400.000,00 €	- €	- €	493.175,28 €	656.787,71 €	- €	- €	163.612,43 €	93.175,28 €	23	CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE ESTENSIONI RETI SONO DETERMINE DALLA RICHIESTE DEI CLIENTI.
101	2014FCHA0085	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - FC - ATO8	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	335.000,00 €	- €	- €	335.000,00 €	998.249,79 €	- €	- €	998.249,79 €	663.249,79 €	197	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
102	2014FCHA0095	RILIEVO RETI FOGNARIE - FC - ATO 8	F	Opere Pluricomunali	Gestore	33.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO	
103	2022FCHA0001	RILIEVO RETI FOGNARIE - ATO 8	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 10.000,00 €	-100	CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE ESIGENZE DI ATTIVITÀ DI RILEVO SULLE RETI FOGNARIE E SUGLI SCOLMATOARI	
104	2022FCHA0003	ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI - ATO8	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	707.000,00 €	- €	- €	707.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 707.000,00 €	-100	CONTO CUMULATIVO CHE COMPRENDE L' ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO E IL RECUPERO DELLE AREE DEI PENSILI DISMESSI DI ATO 8. GLI IMPORTI PIANIFICATI ANNUALMENTE SONO DI LARGA MASSIMA E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI È LEGATA ALL' ESITO DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. NEL 2022 RISULTANO IN PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PENSILE C.NUOVO E PENSILE MARZAGLIA.	
105	2014FCHA0092	RINN. RETI FOG. PROGRAMMATO-FC-ATO 8	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	450.000,00 €	- €	- €	450.000,00 €	714.126,81 €	- €	- €	714.126,81 €	264.126,81 €	58	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTISTICHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
106	2022FCHA0022	MANUT. STRA. IMP. FOGNATURA - FC-ATO 8 - UNICA RETI	F	Opere Pluricomunali	Unica Reti	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Investimento di terzi pianificato 2022	Investimento gestore pianificato 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Investimento di terzi consuntivo 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Valore	%	Note giustificative
107	2014FCHA0089	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE - FC-ATO 8	D	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.010.000,00 €	- €	- €	1.010.000,00 €	2.487.434,45 €	- €	- €	2.487.434,45 €	1.477.434,45 €	146	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
108	2022FCHA0019	RINN. RETI ACQUA PROGRAMMATO - FC-ATO 8 -UNICA RETI	A	Opere Pluricomunali	Unica Reti	- €	- €	- €	- €	- €	22.017,94 €	- €	22.017,94 €	- €	22.017,94 €	100	SCOSTAMENTO LEGATO ALLA NECESSITA' DI COMPENSARE I MINORI IMPORTI 2022 DEGLI ID SPECIFICI FINANZIATI DA UNICA RETI.
109	2014FCHA0088	POTENZIAMENTO RETE ACQ. BORGO DELLE ROSE-MOLINO DI SOPRA	A	Opere Pluricomunali	Romagna Acque	545.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
110	2014FCHA0094	MANUT.STRA. IMP.FOGNATURA - FC-ATO 8	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	380.000,00 €	- €	- €	380.000,00 €	514.175,61 €	- €	- €	514.175,61 €	134.175,61 €	35	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
111	2014FCHA0123	SOST. CTR PARI CALIBRO - FC - ATO8	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.335.000,00 €	- €	- €	1.335.000,00 €	992.783,01 €	- €	- €	992.783,01 €	342.216,99 €	-25	CONTO CUMULATIVO - GLI IMPORTI INSERITI A PIANO SONO DI LARGA MASSIMA. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL PIANO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI
112	2019FCHA0021	INTERCONNESSIONE ACQUEDOTTISTICA BAGNO DI ROMAGNA-TREDOZIO-VERGHERETO-CIVITELLA	A	Opere Pluricomunali	Romagna Acque	508.000,00 €	22.000,00 €	- €	22.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	22.000,00 €	-100	INTERVENTO ANCORA DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E' STATA RIPROGRAMMATA IN RELAZIONE ALLA NON URGENZA DELL'INTERVENTO CHE SI CONFIGURA COME UN COLLEGAMENTO IN GRADO DI MIGLIORARE IL GRADO DI RESILIENZA DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO SUL MEDIO-LUNGO PERIODO
113	2019FCHA0023	STUDIO DI FATTIBILITA' SISTEMA DI ADDUZIONE CIGNO-CIVORIO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
114	2022FCHA0004	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - ATO 8	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	-100	CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE NEL 2022 ESIGENZE DI INTERVENTI SUGLI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI
115	2022FCHA0023	MANUT. STRA. IMP. DEP. - FC - ATO 8 - UNICA RETI	D	Opere Pluricomunali	Unica Reti	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
116	2015FCHA0016	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - FC - ATO 8	A	Opere Pluricomunali	Gestore	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO
117	2014FCHA0086	RIPR.ASFALTI RETE IDRICA - FC - ATO8	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	590.000,00 €	- €	- €	590.000,00 €	459.446,44 €	- €	- €	459.446,44 €	130.553,56 €	-22	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO ASFALTI IN AMBITO ACQUEDOTTISTICO
118	2019FCHA0020	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI ACQUEDOTTO CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 8 FC	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	-100	CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE NEL 2022 ESIGENZE DI INTERVENTI SULLA CONDOTTE PER PROBLEMATICHE DI INTERFERENZE CON LA RETE AUTOSTRADALE
119	2017FCHA0015	ADEGUAMENTO RETE FOG V. S. MARIA IN GIRONE	F	Portico e San Benedetto	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO
120	2015FCHA0021	POTENZIAMENTO DORSALE PORTICO-BOCCONI-S.BENEDETTO	A	Portico e San Benedetto	Gestore	800.000,00 €	- €	- €	- €	- €	423.901,57 €	- €	- €	423.901,57 €	423.901,57 €	100	INTERVENTO IN ESECUZIONE. SCOSTAMENTO LEGATO A RECUPERO DEI RITARDI ACCUMALATI NELLE PASSATE ANNULLITA' (E GIA' MOTIVATI NELLE RELATIVE NOTE DI SCOSTAMENTO ANNUALI)
121	2017FCHA0016	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO A PREDAPPIO IN LOCALITA' SANT'AGOSTINO	F	Predappio	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023
122	2015FCHA0022	DISMISSIONE IMHOFF PRED.ABS 20 E COLEGAMENTO A FORLÌ	F	Predappio	Gestore	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO
123	2022FCHA0010	AMPLIAMENTO VASCA DEL SERBATOIO DI PARATAI	A	Predappio	NON DEFINITO	590.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
124	2022FCHA0005	RIFACIMENTO COLLETTORE PREMILCUORE	F	Premilcuore	NON DEFINITO	1.164.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
125	2019FCHA0026	NUOVO IMPIANTO PRESSIONE CASTROCARO PER SAN CASCIANO	A	Rocca San Casciano	NON DEFINITO	235.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
126	2022FCHA0012	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO STRALCIO I (II LOTTO - V. REPUBBLICA E GIOVANNI XXIII FINO A VIA BELVEDERE)	F	Roncofreddo	Romagna Acque	215.391,00 €	215.391,00 €	- €	215.391,00 €	- €	126.556,49 €	- €	126.556,49 €	- €	88.834,51 €	-41	INTERVENTO TECNICAMENTE TERMINATO. SCOSTAMENTO 2022 DI NATURA CONTABILE LEGATO ALLA TEMPISTICHE DI FATTURAZIONE
127	2018FCHA0002	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO STRALCIO I (I LOTTO -CENTO-CIMITERO)	F	Roncofreddo	Romagna Acque	302.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO
128	2018FCHA0001	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO STRALCIO II (COLLETTAMENTO CENTO - LONGIANO)	F	Roncofreddo	Romagna Acque	2.587.493,00 €	900.000,00 €	- €	900.000,00 €	- €	688.241,10 €	- €	688.241,10 €	- €	211.758,90 €	-23	SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALL' INIZIALE POSTICIPAZIONE DEI LAVORI DOVUTA ALLA DIFFICOLTA' NEL REPERIMENTO DELLE MATERIE PRIME NEL CORSO DEL 2022.
129	2015FCHA0030	RISANAMENTO SC 6 V. VALLE -S.TA PAOLA AGGLOMERATO	F	Roncofreddo	Gestore	387.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023
130	2015FCHA0029	RISAN. RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO V (VIA DEL ZOTTO AGGLOMERATO MINORE DI 200 AE)	F	Roncofreddo	Gestore	241.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
131	2017FCHA0020	SEPARAZIONE RETE S.SOFIA	F	Santa Sofia	Unica Reti	173.788,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO
132	2019FCHA0027	RISANAMENTO SCARICHI 3-4-5 BISERNO (AGGLOMERATI < 200 ABITANTI EQUIVALENTI)	F	Santa Sofia	NON DEFINITO	406.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
133	2015FCHA0031	NUOVO SERBATOIO IN LOC. CA' DI GIANNINI	A	Sarsina	Gestore	92.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO
134	2019FCHA0028	POTENZIAMENTO IMPANTISTICO SERBATOIO SARSINA	A	Sarsina	Romagna Acque	571.000,00 €	28.000,00 €	- €	28.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	28.000,00 €	-100	INTERVENTO ANCORA DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE A SEGUITO DELLO STUDIO DI SISTEMA EFFETTUATO SULL'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI SARSINA, E' RISULTATO CHE E' NECESSARIO PROCEDERE A DEI COLLEGAMENTI E POTENZIAMENTI DI RETE PRIMA DEL POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO.
135	2019FCHA0031	COLLETTAMENTO AL DEPURATORE DI BACCIOLINO	F	Sarsina	Gestore	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
136	2017FCHA0021	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RETE IDRICA IN LOCALITA' FANANTE	A	Sarsina	Gestore	230.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO
137	2019FCHA0030	DISMISSIONE FOSSA IMHOFF E COLLETTAMENTO AL DEPURATORE DI SARSINA	F	Sarsina	Gestore	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
138	2017FCHA0026	POTENZIAMENTO DORSALE SP 138 SARSINA/QUARTO	A	Sarsina	Gestore	1.138.000,00 €	55.000,00 €	- €	- €	55.000,00 €	- €	- €	- €	- €	55.000,00 €	-100	PRIMO STRALCIO CONCLUSO, LA CUI REALIZZAZIONE HA CONSENTITO DI ATTENUARE LE CRITICITA' SUL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO INTERESSATO. LA PROGETTAZIONE DEL SECONDO STRALCIO E' STATA POSTICIPATA IN QUANTO SONO IN CORSO VALUTAZIONI DI CARATTERE TECNICO-ECONOMICO
139	2019FCHA0029	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI SARSINA AL SERVIZIO DI QUARTO	A	Sarsina	Gestore	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO
140	2014FCHA0114	RISANAMENTO SCARICO 2: DEVIAZIONE RETE SCARICO 2	F	Sarsina	Gestore	110.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO
141	2019FCHA0032	INSTALLAZIONE ISPESITORE DINAMICO DEL DEPURATORE DI SAVIGNANO	D	Savignano sul Rubicone	Romagna Acque	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID ANNULLATO IN OCCASIONE DELL'AGGIORNAMENTO DI POI 2022-23 IN QUANTO L'INTERVENTO E' GIA' STATO REALIZZATO E TRACCIATO ALL'INTERNO DELL'ID CUMULATIVO ID 2014FCHA0089. IN QUANTO TRATTASI DELLA SOSTITUZIONE URGENTE DELL'APPARECCHIATURA ESISTENTE CON UN NUOVO DISPOSITIVO
142	2017FCHA0022	DEP.SAVIGNANO ADEG NTOT-COMP.OSS.+SC.IND	D	Savignano sul Rubicone	Unica Reti	4.369.141,00 €	1.890.000,00 €	- €	1.890.000,00 €	- €	2.012.677,13 €	- €	2.012.677,13 €	- €	122.677,13 €	6	
143	2022FCHA0009	REALIZZAZIONE SISTEMA DI FILTRAZIONE DEPURATORE SAVIGNANO	D	Savignano sul Rubicone	Gestore	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Investimento di terzi pianificato 2022	Investimento gestore pianificato 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Investimento di terzi consuntivo 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Valore	%	Note giustificative
144	2019FCHA0035	SPOSTAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEL CANALE CONSORZIALE SITO IN PROSSIMITÀ DELL'INCROCIO VIA ALBERAZZO- VIALE DELLA LIBERTÀ	F	Savignano sul Rubicone	Gestore	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO VERRA' REALIZZATO DAL COMUNE NEL 2023. HERA REMUNERERA' IL COMUNE DEL 50% DEL COSTO DELLA REDISLOCAZIONE E REVAMPING DEL SOLLEVAMENTO FOGNARIO (RESASI NECESSARIA IN SEGUITO ALL' IMPORTANTE MODIFICA DELLA VIABILITA' PRIMARIA)
145	2019FCHA0033	REVAMPING DIGESTORI DEL DEPURATORE DI SAVIGNANO	D	Savignano sul Rubicone	NON DEFINITO	2.000.000,00 €	82.000,00 €	- €	- €	82.000,00 €	- €	- €	- €	- €	82.000,00 €	-100	INTERVENTO ANCORA DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. RIPIANIFICATO IN RELAZIONE AD ATTENUAZIONE DELLE CRITICITA' AD ESSO COLLEGATE.
146	2019FCHA0034	BONIFICA CONDOTTA CAGNONA (I STRALCIO)	F	Savignano sul Rubicone	Unica Reti	500.000,00 €	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	- €	39.080,34 €	- €	39.080,34 €	- €	31.080,34 €	388	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. ANTICIPATA ATTIVITA' DI ANALISI TECNICO-ECONOMICA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE CON SCAVO IN TRINCEA VS TECNOLOGIA NO-DIG
147	2014FCHA0117	RIFACIMENTO FOGNATURA BIVIO MONTEGELLI	F	Sogliano al Rubicone	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
148	2017FCHA0023	ADEGUAMENTO DEPURATORE TREDOZIO - DISINFEZIONE - REALIZZAZIONE	D	Tredozio	Unica Reti	390.385,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO
149	2014FCHA0121	RISANAMENTO SCARICHI 7-33 - FRAZ. ALFERO	F	Verghereto	Gestore	4.950.532,00 €	164.000,00 €	- €	- €	164.000,00 €	27.720,97 €	- €	- €	27.720,97 €	136.279,03 €	-83	ID LEGATO ALL' ADEGUAMENTO SCARICHI DI PRIORITA' 1A AVENTE NUOVA SCADENZA AL 30/06/2026 SECONDO LA DELIBERA REGIONALE 2338/2022. INTERVENTO IN PROGETTAZIONE. SCOSTAMENTO IN LINEA CON LA NUOVA SCADENZA NORMATIVA
150	2015FCHA0035	RISANAMENTO SC.2-3 VERGHERETO	F	Verghereto	Gestore	257.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023
151	2019FCHA0037	RISANAMENTO SCARICO 17 VERGHERETO	F	Verghereto	NON DEFINITO	320.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023
152	2019FCHA0036	RISANAMENTO SCARICHI 1-15-16 VERGHERETO	F	Verghereto	NON DEFINITO	520.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023
153	2017FCHA0024	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO COMUNE DI VERGHERETO LOCALITA' BALZE	F	Verghereto	Gestore	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID CONCLUSO
154	2014FCHA0122	RISAN.SC.9-10-11-24 - FRAZ.RIOFREDDO	F	Verghereto	Gestore	1.042.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023
<b>Totale</b>							<b>19.464.575,00 €</b>	<b>1.460.000,00 €</b>	<b>4.382.213,00 €</b>	<b>13.622.362,00 €</b>	<b>21.524.055,05 €</b>	<b>1.964.503,21 €</b>	<b>4.201.523,26 €</b>	<b>15.358.028,58 €</b>	<b>2.059.480,05 €</b>		

	Importo lordo pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Investimento di terzi pianificato 2022	Investimento gestore pianificato 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Investimento di terzi consuntivo 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura
<b>Importo Totale</b>	19.464.575,00	1.460.000,00	4.382.213,00	13.622.362,00	21.524.055,05	1.964.503,21	4.201.523,26	15.358.028,58	<b>121,7%</b>
<b>Importo Totale - esclusi investimenti di struttura</b>	17.690.191,00	1.460.000,00	4.382.213,00	11.847.978,00	21.524.055,05	1.964.503,21	4.201.523,26	15.358.028,58	

Legenda: A = acquedotto D = depurazione  
F = fognatura AB = acque bianche TT=tutti  
ST=struttura

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore  
F.to Giuseppe Petetta

Il segretario verbalizzante  
F.to Marialuisa Campani

---

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore  
F.to Vito Belladonna

Bologna, 29 gennaio 2024
